

Internt notat

Til: Mads Johnsen

Fra: Vebjørn Opdahl

Ansvarlig: Terje Thuseth

Dato: 15.6.2022


Saksnr.: NVE 201304315

Arkiv:

Kopi:

20044 (VV10906) Røssåga ved Solhaug -Avslutning

Anlegget bygget med utgangspunkt: VV10906 Røssåga ved Solhaug 201304315-7.

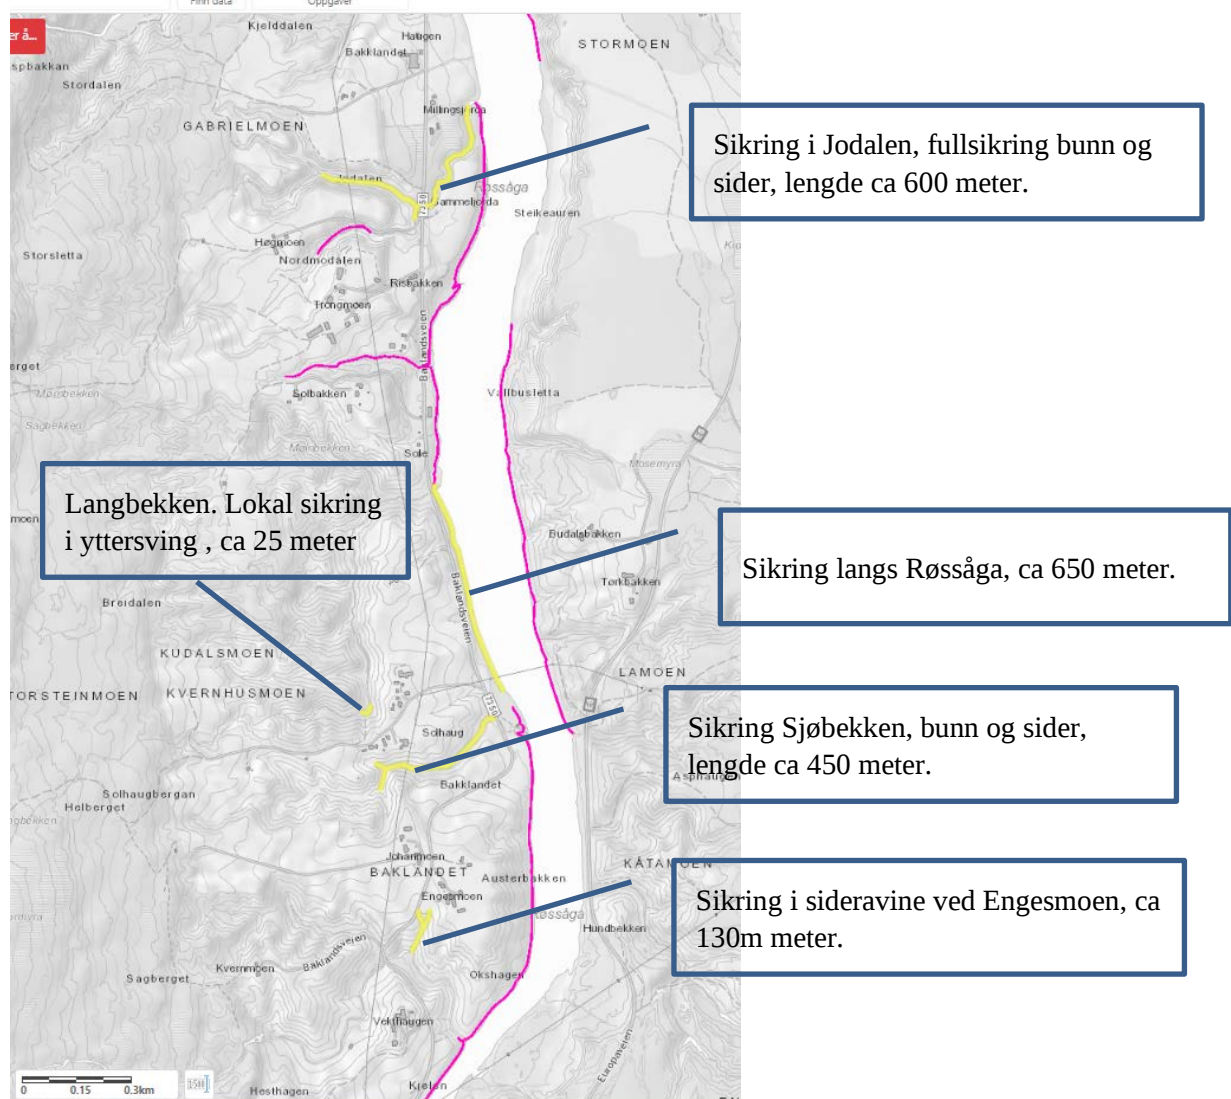

Anlegget er utvidet iht planen:

Jodalen er fullsikret fra utløpet i Røssåga, 600 meters lengde.

Lokal sikring i yttersving i Langbekken ca 25 meter.

Sideravine ved Engesmoen , ca 130 meter.

Det er utført biotopjusterende tiltak, med tilførsel av gytesubstrat ved Jodalen, Sjøbekken og ved Engesmoen. Vandringshinder ved FV-kulvert Langbekken er fjernet.

Produksjon.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	VV10906	Røssåga ved Solhaug						
3	År	2018						
5							lm3	
6	Uke	Røssåga	Bekk 1 Sjøbekken	Bekk 2 Engesmoen	Bekk 3 Jodalen	Langbekken	Totalt	
7	9	1 700	2 370				4 070	
8	10	3 080	2 600				5 680	
9	11	2 800	2 600	100			5 500	
0	12	3 280	0	1 280			4 560	
1	Påske 13						0	
2	14	740	0	100	2 685	300	3 825	
3	15 og 16	2 080	1 080	0	1 120	0	4 280	
4								
5		13 680	8 650	1 480	3 805	300	27 915	
6								
7						NVE Rm		
8						V. Opdahl		

Start fylling uke 9/2018. Fylling utført uke 16-2018. Medgått steinmengder: 27915 lm3.

Mottak og legging ved NVE Anlegg. Steinleveranse ved Johansen Maskin. Legging /arrondering 2 kv 2018.

Bokførte kostnader : kr 4.816.570,92

Budsjetterte kostnader: kr 6.000.000,-

Finansiering: Hemnes kommune 20%, Statens Vegvesen 20%, NVE 60 %.

Befaring og overlevering av anlegget 16.06.2022.

Trond Stien fra Hemnes kommune, Vebjørn Opdahl NVE Rm



Fylling langs Røssåga sett
medstrøms, juni /2022
