

NVE

POSTBOKS 5091 MAJORSTUEN
0301 OSLO

24.03.2021

**KOMMENTAR TIL HØRING FOR OSANE KRAFTVERK, SULDAL
KOMMUNE, ROGALAND
SØKNAD OM FORLENGELSE AV KONSESJON****Bakgrunn**

Vi viser til e-post der dere ber om Småkrafts kommentarer på mottatte høringsutsagn vedrørende søknad om forlengelse av byggefrist for Osane kraftverk.

Følgende interessenter har gitt sitt høringsutsagn i saken:

- Statsforvalteren i Rogaland
- Kolbein Kjetilstad
- Suldal kommune
- Rogaland fylkeskommune
- Naturvernforbundet i Rogaland


Felles for alle høringsutsagn unntatt kommentar fra Kolbein Kjetilstad er at de er negativ til forlengelse av konsesjon. Felles tema er forhold til villrein, hubro og kunnskapsgrunnlaget. Kolbein Kjetilstad mener det ikke er naturlig at Verneområdestyre uttaler seg til forhold på utsiden av vernegrensen.

For miljøfaglig vurdering har Multiconsult uttalt seg på vegne av Småkraft. Teksten er inntatt under kapittel miljø.

MiljøForholdet til hubro og villrein

Forholdet til hekkende hubro er trekt frem som et ankepunkt mot utbyggingsplanene av både Suldal kommune og Statsforvalteren i Rogaland. Småkraft er av den oppfatning at det faktisk at det planlegges tunnel mellom inntaket og kraftstasjonen ved Osane, og ikke anleggsveg og nedgravd rørgate via østsiden av Botnavatnet, vil bidra til å redusere risikoen for negativ påvirkning på det hekkende paret i vesentlig grad. Videre legges det opp til å følge anbefalingene i notatet «Anbefalte hensynssoner for sårbare arter av fugl» (Multiconsult, 2018) og gjennomføre arbeidet på planlagt inntak utenom hekkesesongen (1. februar – 31. juli). Gjennomfører man arbeidet på inntaket i perioden august - november, når ungene har forlatt reiret og de voksne fuglene streifer mye rundt i dette fjellområdet, er det lite som tilsier at anleggsaktiviteten oppe ved inntaket vil påvirke hekkesuksessen til det aktuelle paret, hverken i den kortsiktige anleggsfasen eller den langsiktige

driftsfasen. Selve kraftstasjonsområdet ligger mye mer skjermet til ift. hekkelokaliteten, og her er det mindre behov for avbøtende tiltak i anleggsfasen.

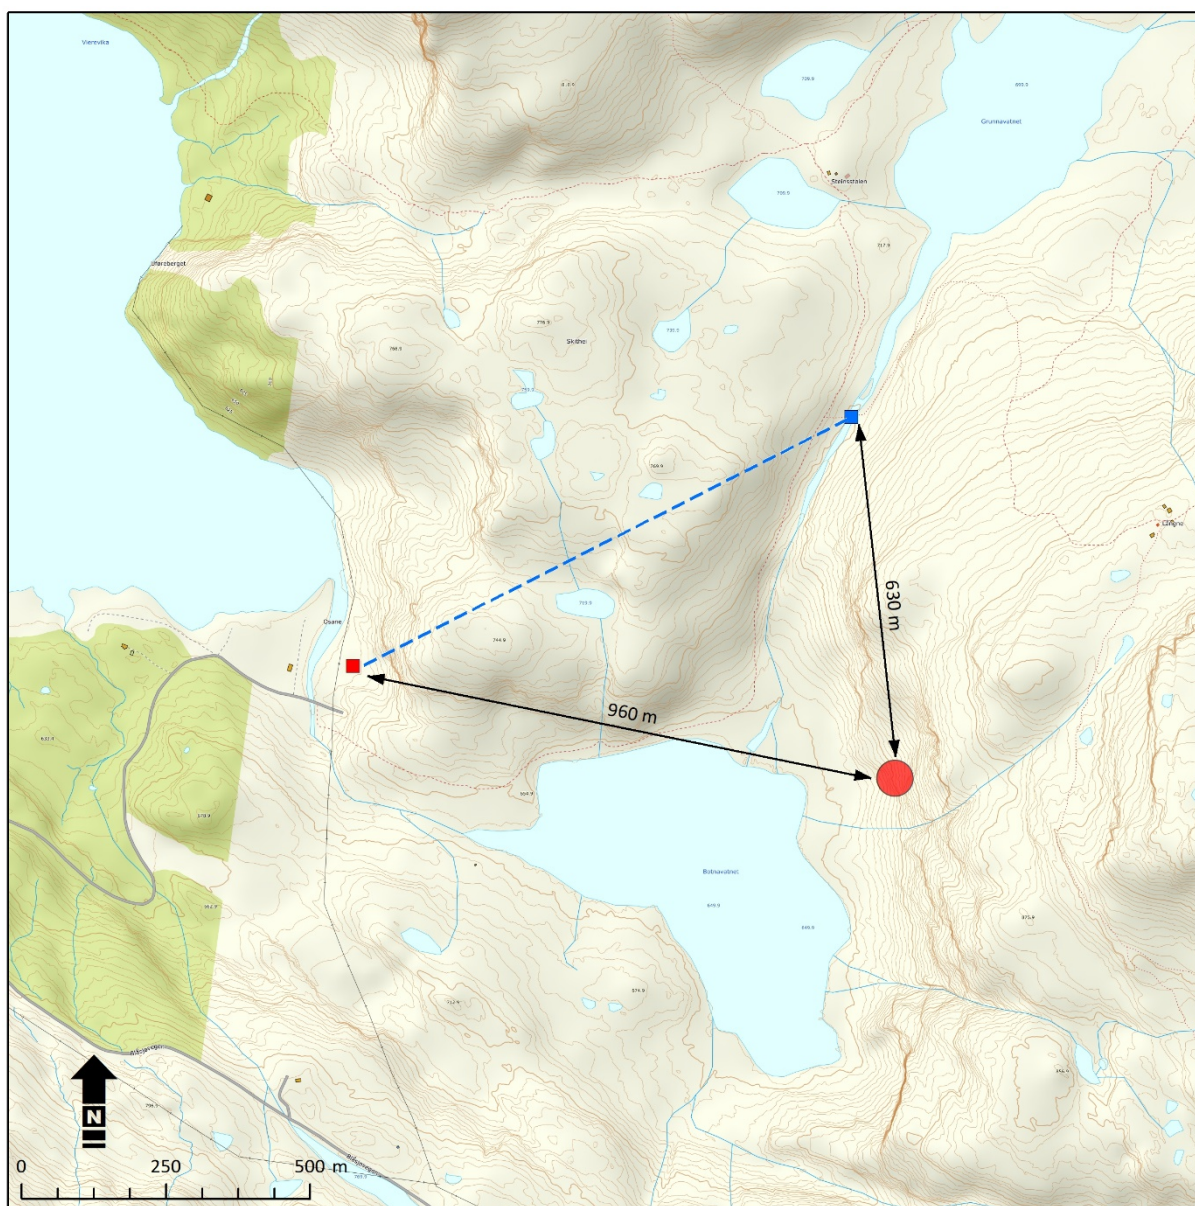

Figur 1. Beliggenhet til inntak og kraftstasjon. Nøyaktigheten til angitt hubrolokalitetet er ikke kjent, men det antas at reirhylla ligger på østsiden av Botnavatnet.

Videre er forholdet til villrein kommentert av Suldal kommune og Statsforvalteren. De påpeker at systematiske registreringer i Suldal kommune i 2020 viste at den mest kritiske tida for villrein i dette området er fra januar til april. De skriver også at det er ønskelig å tilrettelegge for mer aktiv bruk av sommerbeitene lenger vest og at de vurderer det som negativt at området blir berørt av anleggsarbeid. Til dette vil vi påpeke at det av hensyn til hekkende hubro (se ovenfor) ikke ansees som aktuelt å gjennomføre anleggsarbeid oppe ved inntaket i perioden februar – juli, noe som også vil være gunstig for villreinen som evt trekker ned i fjellbjørkeskogen rundt Botnavatnet i vintermånedene (i den grad den har tilhold i dette området på utbyggingstidspunktet). Selve inntaket vil utgjøre et svært begrenset inngrep i terrenget i driftsfasen, og hvis man får bygget dette i en periode hvor det ikke er villrein i området (se forslag til tiltak under) er det lite som tilsier at inntaket vil medføre langsiktige negative konsekvenser for villreinens arealbruk i dette området.

Selve kraftstasjonsområdet er planlagt i nær tilknytning til et område som allerede er en del benyttet i forbindelse med friluftsliv, jakt og fiske (hytte, parkeringsplass, etc., jf. bildet under). Samlokaliseringen med eksisterende inngrep/bygninger og områder med mye menneskelig aktivitet tilsier at selve kraftstasjonen vil utgjøre en marginal tilleggs-belastning i driftsfasen.



Figur 2. Beliggenhet til planlagt kraftstasjon.

Nye undersøkelser

Når det gjelder kartlegging av fuktighetskrevede naturtyper, moser og lav langs berørt elvestrekning vil Småkraft dersom NVE krever det foreta nye undersøkelser. Kartleggingen må gjennomføres sommeren 2021.

Nett

Småkraft har fått oppdatert nettsituasjonen og Statnett og Suldal Elverk har kommentert at det er kapasitet for nettilknytning på Osane. Som en del av videre fremdrift for prosjektet planlegges det avklaring med Statnett for bruk av lokal linje frem til overliggende nett.

Oppsummering

Småkraft ber om at det gis utsatt frist for idriftsettelse av anlegget under forutsetning av at:

- Det av hensyn til hubro og villrein ikke gjennomføres anleggsarbeid på inntaket i perioden 1. februar til 31. juli.
- Det før anleggsarbeidet på inntaket starter opp gjennomføres en befaring av området for å forsikre seg om at det ikke er rein i området på det aktuelle tidspunktet.
- Det gjennomføres støydempende tiltak på kraftstasjonen og at omfanget av ytre belysning reduseres til et minimum.

Med vennlig hilsen
Småkraft AS

Martin Vangdal
prosjektleder
